鯖江市橋梁長寿命化修繕計画

平成 31 年 2 月

福井県鯖江市都市整備部土木課

１．長寿命化の目的

１）背景

○ 鯖江市が管理する道路橋は、現在総計 420 橋（2m 以上の全橋梁）ある。このうち架設後 50 年※1 を経過する高齢化橋梁は 137 橋（32%）ある。（図-1 参照）

○ また、20 年後にはこれらの橋梁の高齢化が急速に進展し、建設後 50 年を経過する高齢化橋梁の割合は 85%を占めることとなる。（図-１参照）

○ このような背景から、今後増加傾向にある老朽化橋梁を、これまで通りの事後的な補修・更新をおこなっていった場合、大規模補修や橋梁の架替が一時的に集中することとなり、橋梁を適切に維持管理できなくなる。

○ 鯖江市においては、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに要する経費に対し、計画的な維持管理をおこなうことにより、コストの平準化・縮減への取り組みを行う必要がある。

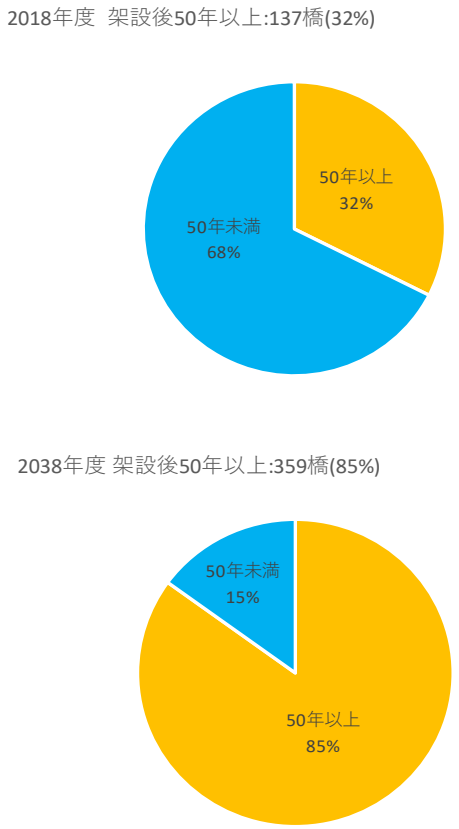

図-1 鯖江市における今後２０年間の橋梁全体に占める老朽化橋梁（架設後50年以上）の割合の推移

２）目的

○ 鯖江市では、橋梁の点検や補修対策を計画的に進めることにより、橋梁の機能を確実に維持する。そして、市民が安心・安全に道路を通行できるようにする。

○ 鯖江市では、これまで、損傷を把握した後に事後的な対応をおこなってきた。今後は、計画的かつ予防的な対応に転換を図り、橋梁を長寿命化（100 年間を目標）する。これにより、事後的な対応による事業費に比べて、コストの縮減を図ることが出来る。

※1：一般的に建設後 50 年が更新の目安とされている。

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

○対象橋梁の内訳

	15m以上	15m 未満	合計
対象橋梁数	73	349	422

※公式な橋梁数は 420 であるが、跨線橋を鉄道部と一般部に分けてカウントしているため合計が 422 となっている。なお、橋梁一覧にある No.115 踏雲橋は横断歩道橋であるが、本計画に含める。

３．健全度の把握及びその活用方針

１）健全度把握の基本的考え方

○ 鯖江市では、橋梁の点検を「国土交通省 道路橋定期点検要領 平成 26 年 6 月」及び「福井県 橋梁定期点検マニュアル 平成 28 年 4 月」に基づいて実施する。橋梁毎に損傷の有無を把握するためにおこなう点検と、橋梁毎、径間毎に損傷の程度を把握するためにおこなう点検にて橋梁の健全度を把握する。

２）計画期間

○ 鯖江市では、今後 10 年間の長寿命化計画を策定する。また、橋梁点検を計画的に実施し、その点検結果を確実に蓄積する。蓄積された点検結果については、今回策定された長寿命化修繕計画の更新及び次回点検をおこなう際にフィードバックを行い継続的に活用する。

４．維持管理の基本方針

○ 維持管理費の縮減のため予防保全を推進し、計画的な補修を行い橋梁の寿命 100 年を目標とする。

○ 予防保全対象橋梁については、架設後 40 年を目途に長寿命化のための補修を行う。長寿命化は、橋齢の高いものから順に健全度および重要度評点を考慮して実施する。なお、重要度評点は、路下条件、緊急輸送路、橋長、迂回路の有無、三大損傷の有無、日常生活における役割、交通量を点数化して定めたものである。

○ 小規模橋梁については長寿命化による費用削減効果が期待できないため、事後保全とする。

○ 日常的な維持管理の実施

鯖江市では、橋梁を良好な状態に保つため、日常的なパトロールや清掃などを行う。

５.新技術等の活用方針

○定期点検および修繕の実施にあたっては、道路メンテナンスに関わる新たな動向を的確に捉え、新技術の積極的な活用を推進する。

６．費用縮減に関する具体的方針

○今後５０年間の修繕方針について、予防保全型の維持管理をすることにより、費用縮減を図る。

○鯖江市が管轄する橋梁を「①重要な橋梁」と「②その他の橋梁」に選別し、①については従来どおり定期点検業務を外注し、新技術等を活用しながら点検を行っていく。②については、市職員による直営点検を行う。外注する橋梁数を減らすことにより、点検費用の縮減を図る。

７．施設の集約化・撤去に関する具体的方針

○上記「②その他の橋梁」の中で特に重要度の低いものについては、代替路線、近傍の集約化できる橋梁がある場合は地元調整しながら積極的に集約・撤去を行い、維持管理費の縮減を図る。

８．対象橋梁と健全度一覧

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長	幅員	架設年	健全度判定	重要度評点	前回点検年度
1	桜町 2 号橋	有定鳥羽線	桜町	Box-C	2.35	19.6	昭和 34 年	Ⅲ	45	2016
2	天神橋	三尾野吉江線	西番町	鋼橋	83.76	11.25	平成 14 年	Ⅲ	20	2017
3	旭橋	鉱泉線	上河内町	RC 橋	7.45	4.5	昭和 38 年	Ⅲ	20	2016
4	出口橋	横越中野出口線	中野町	RC 橋+PC 橋	37.9	9.7	昭和 40 年，昭和 60 年拡幅	Ⅲ	20	2015
5	出口橋歩道橋	横越中野出口線	中野町	鋼 RC 橋	37.6	2.5	昭和 40 年	Ⅲ	20	2015
6	仲屋橋	上河端新出 2 号線	上河端町	鋼 RC 橋	29.8	4.6	昭和 42 年	Ⅲ	10	2017
7	日野川沿排水路橋	糺ﾆｭｰﾀｳﾝ 2 号線	糺町	鋼 RC 橋+RC 橋	8.2	8.2	昭和 35 年，拡幅年不明	Ⅲ	10	2016
8	西前田橋	河和田 5 号線	河和田町	RC 橋	8.3	3.3	昭和 25 年	Ⅲ	10	2016
9	溜池橋	鳥井3号線	鳥井町	RC 橋	8.2	3.6	昭和 43 年	Ⅲ	5	2017
10	水落 6 号橋	有定鳥羽線	水落町	RC 床版橋	9	10	昭和 52 年	Ⅱ	95	2014
11	水落 5 号橋	有定鳥羽線	水落町	RC 床版橋	4	10	昭和 52 年	Ⅱ	90	2014
12	水落 7 号橋	有定鳥羽線	水落町	PC 橋	3	10	昭和 52 年	Ⅱ	90	2014
13	吉江橋	杉本吉江線	吉江町	鋼 RC 橋	80.8	13.8	平成 15 年	Ⅱ	70	2017
14	小黒町16号線1号橋	小黒町16号線	小黒町 3 丁目	PC 橋	34	12.8	平成 08 年	Ⅱ	55	2015
15	西山跨線橋(鉄道横断部)	市町村道西山長泉寺線	本町 4 丁目	鋼橋	30	8.1	平成 06 年	Ⅱ	55	2015
16	黒津橋	染南線	神中町 3 丁目	PC 橋	24	16.9	昭和 50 年	Ⅱ	50	2015
17	落井西4号橋	片上落井線	落井町	Box-C	2	14.2	昭和 52 年	Ⅱ	50	2015
18	落井西橋	片上落井線	落井町	PC 橋	30.6	9.75	昭和 54 年	Ⅱ	45	2015
19	枇杷橋	鯖江駅東線	横越町	PC 橋	24.1	16.8	平成 05 年	Ⅱ	40	2015
20	杉本 6 号橋	杉本吉江線	杉本町	RC 床版橋	2.4	17.1	昭和 46 年	Ⅱ	40	2017
21	弁天橋	吉江 7 号線	吉江町	PC 橋	73	6.7	平成 14 年	Ⅱ	35	2017
22	長表橋	白鬼女下新庄線	下新庄町	PC 橋	18.67	8.2	昭和 52 年	Ⅱ	35	2015
23	新橋	別所川島線	落井町	鋼 RC 橋	20.8	4.6	昭和 30 年	Ⅱ	35	2015
24	川島大橋	鯖江河和田線	川島町	鋼 RC 橋	63.6	12.8	平成 21 年	Ⅱ	35	2015
25	大門東橋	石田上東線	石田上町	PC 橋	15.25	8.2	平成 05 年	Ⅱ	35	2017
26	桜町南橋	駅前線	住吉町 3 丁目	RC 床版橋	6	12.1	昭和 46 年	Ⅱ	35	2015
27	莇生田橋	河和田莇生田2号線	莇生田町	鋼 RC 橋	20.4	8.2	昭和 60 年	Ⅱ	30	2015
28	水落東 1 号橋	水落東 11 号線	水落町	PC 橋	15.9	9.2	不明	Ⅱ	30	2017
29	丹南橋	丹南広域道西線	小黒町 3 丁目	PC 橋	182.5	11.8	平成 02 年	Ⅱ	30	2015
30	舟枝3号橋	舟枝乙坂線	中野町	PC 橋	9.4	6.7	昭和 49 年	Ⅱ	30	2015
31	冬島橋	石田野田線	下野田町	PC 橋	9.8	6.8	昭和 46 年	Ⅱ	30	2015
32	北野 5 号橋	三六 10 号線	北野町	RC 床版橋	4.5	8.6	昭和 47 年	Ⅱ	25	2016
33	野原橋	戸ノ口7号線	戸口町	鋼 RC 橋	17.95	3.6	昭和 40 年	Ⅱ	25	2015
34	神通川2号橋	田村西大井線	川去町	鋼 RC 橋	19.1	4.6	昭和 46 年	Ⅱ	25	2015
35	葦ヶ淵橋	莇生田8号線	別司町	鋼 RC 橋	16.3	4.8	昭和 40 年	Ⅱ	25	2015
36	曲木橋	上河端橋立線	中野町	RC 橋	33.8	6.65	昭和 41 年	Ⅱ	25	2015
37	水落橋	鯖江駅北線	水落町	鋼橋	39	16.8	平成 01 年	Ⅱ	25	2015
38	宮下橋	杉本石田上線	石田上町	PC 橋	13	7.2	平成 04 年	Ⅱ	20	2017
39	石田神社橋	石田上 22 号線	石田上町	PC 橋	12.9	7.2	昭和 62 年	Ⅱ	20	2017
40	いの割橋	石田上 21 号線	石田上町	PC 橋	11.9	7.2	昭和 62 年	Ⅱ	20	2017
41	西杉本橋	杉本 28 号線	杉本町	RC 床版橋	6.7	12.05	平成 05 年	Ⅱ	20	2017
42	鳥羽橋	鳥羽中芦山線	神明町 5 丁目	PC 橋	71	8.4	平成 16 年	Ⅱ	20	2017
43	平成橋	鯖浦線	水落町	PC 橋	181.3	5.8	平成 02 年	Ⅱ	20	2017
44	叔羅橋	丹南自転車道線	舟津町 5 丁目	鋼橋	177.6	3.8	平成 02 年	Ⅱ	20	2017
45	西番 5 号橋	処理場南線	西番町	RC 床版橋	6.8	14.15	平成 05 年	Ⅱ	20	2017
46	石田堤防橋	石田堤防線	石田上町	PC 橋	11.8	8.2	昭和 60 年	Ⅱ	20	2017
47	大野西橋	片上落井線	南井町	Box-C	2	19.3	昭和 47 年	Ⅱ	20	2015
48	大野水門橋	片上落井線	南井町	Box-C	4.15	22.2	昭和 48 年	Ⅱ	20	2015
49	東石田橋	石田上 10 号線	石田上町	PC 橋	14.15	4.7	昭和 44 年	Ⅱ	20	2017
50	和田川東橋	石田和田橋線	石田下町	PC 橋	17	7.5	昭和 48 年	Ⅱ	20	2015
51	落井西3号橋	片上落井線	落井町	RC 橋	4.4	17.5	昭和 52 年	Ⅱ	20	2015
52	米岡橋	北部循環線	米岡町	PC 橋	79.7	13.8	平成 17 年	Ⅱ	20	2017
53	坂上橋	西袋寺中線	西袋町	鋼 RC 橋	6.2	6.7	昭和 40 年	Ⅱ	20	2015
54	和田橋	石田和田橋線	石田下町	PC 橋	37.7	7.5	昭和 48 年	Ⅱ	20	2015
55	黒津第 3 橋	神明 27 号線	御幸町 4 丁目	PC 橋	23.7	3	昭和 57 年	Ⅱ	15	2017
56	黒津橋	下河端水落 2 号線	下河端町	PC 橋	21.5	8.2	昭和 63 年	Ⅱ	15	2017
57	荒子橋	石田和田橋線	石田下町	RC 橋+PC 橋	12.7	8.6	昭和 41 年,拡幅年不明	Ⅱ	15	2015
58	黒津第 2 橋	神明 20 号線	神中町 3 丁目	鋼 RC 橋	23	7.2	昭和 59 年	Ⅱ	15	2015
59	漆原橋	漆原上野田線	漆原町	PC 橋	13.7	25.6	昭和 57 年	Ⅱ	15	2017
60	黒津川歩道橋	黒津川歩道橋線	下河端町	鋼橋	19.25	1.6	昭和 59 年	Ⅱ	15	2017
61	岩立橋	石生谷和田線	下野田町	RC 橋+PC 橋	10	9.05	昭和 45 年，拡幅年不明	Ⅱ	15	2015
62	川去橋	川去北線	川去町	鋼 RC 橋	13.6	9.2	昭和 56 年	Ⅱ	15	2015
63	莇生田西橋	河和田莇生田2号線	莇生田町	鋼 RC 橋+PC 橋	15.8	7.55	昭和 54 年,平成 19 年拡幅	Ⅱ	15	2015
64	上河内橋	上河内清根線	上河内町	RC 橋+PC 橋	10.5	7.7	昭和 07 年	Ⅱ	15	2016
65	杉本8号橋	丸山杉本線	杉本町	RC 床版橋	2.9	17.2	昭和 44 年	Ⅱ	15	2015
66	沖田橋	別所川島線	川島町	RC 床版橋	6.4	10.6	昭和 48 年	Ⅱ	15	2015
67	東公園橋	横越7号線	横越町	鋼 RC 橋	24.7	3	昭和 42 年	Ⅱ	15	2015
68	中戸口橋	磯部中戸ノ口線	中戸口町	PC 橋	12.1	10.8	平成 11 年	Ⅱ	15	2015
69	吉谷南橋	吉谷南線	吉谷町	PC 橋	11.4	6.8	昭和 47 年	Ⅱ	15	2015
70	内島橋	河和田 8 号線	河和田町	RC 橋	8.6	3.8	昭和 27 年	Ⅱ	10	2016
71	小門橋	河和田莇生田 2 号線	河和田町	鋼 RC 橋	9.7	4.3	昭和 26 年	Ⅱ	10	2016
72	片山東橋	片山 4 号線	片山町	鋼 RC 橋	11.05	3	昭和 50 年	Ⅱ	10	2016
73	佐治広橋	河和田 6 号線	河和田町	RC 橋	8.4	3.85	昭和 27 年	Ⅱ	10	2016
74	水門橋	鳥井日野川堤防線	鳥井町	鋼 RC 橋	40.2	4.3	昭和 37 年	Ⅱ	10	2015
75	清水町橋	東清水4号線	東清水町	鋼 RC 橋	10.9	4.6	昭和 49 年	Ⅱ	10	2017
76	神山東橋	若葉西和台線	冬島町	PC 橋	21.2	5.7	昭和 60 年	Ⅱ	10	2015
77	津子出橋	戸ノ口1号線	戸口町	鋼 RC 橋	19.05	3	昭和 40 年	Ⅱ	10	2015
78	余田橋	西大井持明寺線	持明寺町	鋼 RC 橋	15.1	7.8	昭和 43 年，平成 01 年拡幅	Ⅱ	10	2015

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長	幅員	架設年	健全度判定	重要度評点	前回点検年度
79	神通川橋	西大井学校線	持明寺町	鋼 RC 橋	15.2	4.6	昭和 44 年	Ⅱ	10	2017
80	下河原橋	北中 2 号線	北中町	鋼 RC 橋	10.25	5.45	昭和 20 年	Ⅱ	10	2016
81	戸口上橋	戸ノ口1号堤防線	戸口町	鋼 RC 橋	17.9	1.2	昭和 49 年	Ⅱ	10	2017
82	一本橋	曲木4号線	中野町	鋼 RC 橋	41	2.1	昭和 39 年	Ⅱ	10	2016
83	御寺橋	落井4号線	落井町	RC 橋	22.1	2.5	昭和 27 年	Ⅱ	10	2015
84	小山橋	戸ノ口3号線	戸口町	鋼 RC 橋	16.2	2.65	不明	Ⅱ	10	2014
85	戸口大橋	北中戸ノ口線	戸口町	RC 床版橋	15.89	8.65	昭和 33 年,拡幅年不明	Ⅱ	10	2015
86	河端橋	岩立冬島線	和田町	鋼 RC 橋	20.5	4.7	昭和 43 年	Ⅱ	10	2017
87	榛木橋	上河端新出 3 号線	上河端町	鋼 RC 橋	32.5	3.6	昭和 42 年	Ⅱ	10	2015
88	郷勺橋	下新庄幹線	下新庄町	PC 橋	37.7	4.3	昭和 48 年	Ⅱ	10	2017
89	河端橋	下新庄 13 号線	下新庄町	鋼 RC 橋	34.3	4.8	昭和 47 年	Ⅱ	10	2017
90	新村橋	新町 4 号線	下新庄町	鋼 RC 橋	34.1	4.8	昭和 45 年	Ⅱ	10	2017
91	広瀬橋	舟枝上河端線	上河端町	鋼 RC 橋	37.8	4.25	昭和 43 年	Ⅱ	10	2015
92	坊主橋	上河端新出 1 号線	上河端町	鋼 RC 橋	29.8	3.6	昭和 42 年	Ⅱ	10	2015
93	天神橋	北中戸ノ口線	河和田町	RC 床版橋	10	10.4	昭和 33 年	Ⅱ	10	2016
94	狐橋	東鯖江上河端線	上河端町	PC 橋	36.85	6	昭和 41 年	Ⅱ	10	2014
95	赤橋歩道橋	上戸口中央線	上戸口町	RC 床版橋	7	2.5	昭和 60 年	Ⅱ	5	2017
96	東陽中北橋	東陽中北線	落井町	PC 橋	7.7	4.8	昭和 50 年	Ⅱ	5	2017
97	五反田橋	磯部中戸ノ口2号線	戸口町	PC 橋	13.1	4.9	昭和 47 年	Ⅱ	5	2017
98	上野田橋	上氏家漆原線	上野田町	PC 橋	13	6.8	昭和 46 年	Ⅱ	5	2017
99	尾花橋	沢寺中線	尾花町	PC 橋	6.3	6.8	昭和 50 年	Ⅱ	5	2017
100	下氏家北橋	上下氏家線	下氏家町	PC 橋	8	6.8	昭和 45 年	Ⅱ	5	2017
101	神通橋	川去5号線	川去町	Box-C	13	18.2	昭和 43 年	Ⅱ	5	2017
102	沢橋	沢 5 号線	沢町	RC 橋	9	4.6	昭和 40 年	Ⅱ	5	2016
103	当田3号橋	石生谷熊田線	当田町	RC 床版橋	6.7	8.1	昭和 43 年	Ⅱ	5	2017
104	吉谷東橋	別所中央線	四方谷町	RC 橋+PC 橋	10.4	6.8	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
105	野田橋	石生谷熊田線	漆原町	PC 橋	11.6	8	昭和 46 年	Ⅱ	5	2017
106	大下田橋	河和田 15 号線	河和田町	鋼 RC 橋	12.7	5.7	不明	Ⅱ	5	2016
107	赤橋	上戸口中央線	上戸口町	RC 床版橋	6.7	6.5	昭和 39 年	Ⅱ	5	2016
108	持明寺橋	西大井平井線	持明寺町	RC 床版橋	7.9	17.75	昭和 38 年	Ⅱ	5	2016
109	金谷南橋	金谷2号線	寺中町	PC 橋	8.4	4.4	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
110	論手橋	小泉 7 号線	小泉町	鋼 RC 橋	9.6	7.3	昭和 45 年	Ⅱ	5	2016
111	片上橋	吉谷喉橋線	吉谷町	鋼 RC 橋	12.2	7.2	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
112	東清水橋	東清水8号線	東清水町	鋼 RC 橋	11	4.1	昭和 46 年	Ⅱ	5	2017
113	三の和田橋	下野田 13 号線	和田町	PC 橋	12.1	6.7	昭和 45 年	Ⅱ	5	2017
114	橋立東橋	吉谷橋立線	橋立町	PC 橋	12.5	7.2	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
115	踏雲橋	西山長泉寺線	長泉寺町 1 丁目	PC 橋	10.25	5.6	平成 07 年	Ⅰ	50	2015
116	平井自転車道橋	鯖浦自転車線	平井町	PC 橋	8.3	5.8	平成 02 年	Ⅰ	35	2017
117	落井西橋歩道橋	片上落井線	落井町	鋼 RC 橋	30.3	3.8	平成 17 年	Ⅰ	30	2017
118	神明橋	有定鳥羽線	鳥羽 1 丁目	鋼 RC 橋	71.5	14.8	平成 13 年	Ⅰ	30	2016
119	東陽中橋	東陽中東線	川島町	PC 橋	9.6	12.2	昭和 60 年	Ⅰ	30	2015
120	踏雲橋（一般部）	西山長泉寺線	長泉寺町	PC 橋	43.12	2.7	平成 07 年	Ⅰ	25	2015
121	水窪橋	舟枝乙坂線	吉谷町	PC 橋	68.2	7.2	平成 20 年	Ⅰ	25	2015
122	新横江橋	新町新横江線	横越町	鋼 RC 橋	17.4	6.8	昭和 42 年	Ⅰ	25	2015
123	吉谷橋	別所吉谷線	四方谷町	RC 橋	13.9	11.4	平成 27 年	Ⅰ	25	2017
124	河端橋	橋立下河端線	下河端町	PC 橋	51.3	8.2	平成 13 年	Ⅰ	25	2015
125	鳥羽小橋	神明 11 号線	御幸町 4 丁目	PC 橋	24.2	6.4	昭和 55 年	Ⅰ	25	2015
126	糺ニュータウン西橋	糺ニュータウン 8 号線	糺町	RC 床版橋	10.5	4.4	昭和 58 年	Ⅰ	25	2017
127	川島橋	別所川島線	川島町	PC 橋	41.2	9	平成 22 年	Ⅰ	20	2015
128	西郷勺橋	下新庄 4 号線	下新庄町	RC 床版橋	8.8	6	昭和 63 年	Ⅰ	20	2017
129	桃源清水 2 号橋	桃源清水線	上河内町	RC 床版橋	9.5	5.25	平成 17 年	Ⅰ	20	2017
130	桃源清水 3 号橋	桃源清水線	上河内町	RC 床版橋	6.3	5.3	平成 17 年	Ⅰ	20	2017
131	磯部橋	磯部中戸ノ口線	磯部町町	PC 橋	28.7	7.2	平成 22 年	Ⅰ	20	2015
132	松成橋	松成幹線	松成町	PC 橋	69.6	7.2	平成 22 年	Ⅰ	15	2017
133	喉橋	吉谷喉橋線	吉谷町	PC 橋	69.3	7.2	平成 22 年	Ⅰ	15	2017
134	公園東橋	西袋寺中線	寺中町	PC 橋	7.3	4.6	昭和 48 年	Ⅰ	15	2015
135	西山跨線橋(一般部)	西山長泉寺線	長泉寺町 1 丁目	PC 橋	49.98	8.1	平成 06 年	Ⅰ	15	2015
136	黒橋	高速側道 4 号線	下河端町	PC 橋	50.3	4.2	平成 12 年	Ⅰ	15	2017
137	大門橋	河和田4号橋	河和田町	鋼 RC 橋	8.2	4.8	平成 19 年	Ⅰ	10	2017
138	日之出橋	河和田中道線	河和田町	Box-C	7.1	10	平成 18 年	Ⅰ	10	2017
139	片山橋	片山 2 号線	片山町	RC 橋	11.3	4	平成 21 年	Ⅰ	10	2016
140	東清水西橋	東清水 6 号線	東清水町	PC 橋	13.9	5.1	不明	Ⅰ	10	2016
141	落井橋	落井北線	落井町	PC 橋	25.8	5.6	平成 03 年	Ⅰ	10	2017
142	中橋	落井6号線	落井町	PC 橋	28.65	5.8	平成 19 年	Ⅰ	10	2017
143	かり橋	川島北線	川島町	PC 橋	32.2	6.2	平成 21 年	Ⅰ	10	2017
144	八幡橋	片山3号線	片山町	RC 橋	12.4	5.2	平成 27 年	Ⅰ	10	2017
145	北中 2 号橋	北中沢線	北中町	鋼 RC 橋	10.7	5	昭和 58 年	Ⅰ	10	2016
146	冬島西 2 号橋	西大井幹線	冬島町	PC 橋	15.9	8.2	平成 14 年	Ⅰ	10	2017
147	石田 1 号橋	石田和田川排水機場線	石田下町	PC 橋	16.2	6.2	昭和 58 年	Ⅰ	10	2017
148	大橋	小山線	川島町	PC 橋	34	3.9	平成 21 年	Ⅰ	10	2017
149	北中橋	東清水 5 号線	北中町	PC 橋	11.2	5.2	平成 21 年	Ⅰ	10	2016
150	ラポーゼ西橋	上河内 4 号線	上河内町	PC 橋	15.1	6.2	平成 09 年	Ⅰ	10	2017
151	中山橋	河和田区画整理 8 号線	西袋町	PC 橋	9.2	10.4	昭和 54 年	Ⅰ	10	2017
152	谷橋	片山西袋線	西袋町	RC 床版橋	7.8	6.1	昭和 54 年	Ⅰ	10	2017
153	椿坂東橋	西袋 1 号線	西袋町	RC 床版橋	7.7	9	昭和 54 年	Ⅰ	10	2017
154	椿坂橋	河和田区画整理13号線	西袋町	RC 床版橋	7.75	6	昭和 53 年	Ⅰ	10	2017
155	下野田北橋	下野田 18 号線	下野田町	PC 橋	8.6	5.7	昭和 42 年	Ⅰ	5	2017
156	西袋2号橋	西袋7号線	西袋町	PC 橋	9.5	7.9	昭和 48 年	Ⅰ	5	2017
157	青年の家橋	上氏家・漆原2号線	上野田町	PC 橋	11.1	7.7	昭和 60 年	Ⅰ	5	2017
158	二ノ和田1号橋	相生和田線	和田町	PC 橋	12.1	6.7	平成 06 年	Ⅰ	5	2017

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長	幅員	架設年	健全度判定	重要度評点	前回点検年度
159	上河内下橋	上河内3号線	上河内町	PC 橋	13.5	7.7	昭和 48 年	Ⅰ	5	2017
160	平井南橋	平井南線	平井町	RC 床版橋	8.7	5.9	昭和 50 年	Ⅰ	5	2017
161	黒金橋	上河内2号線	上河内町	PC 橋	10.1	8.8	平成 22 年	Ⅰ	5	2017
162	尾花中橋	尾花 1 号線	尾花町	RC 橋	10.7	7.1	昭和 46 年	Ⅰ	5	2016
163	冬島西橋	岩立冬島線	冬島町	PC 橋	9.2	5.2	昭和 46 年	Ⅰ	5	2017
164	桃源清水 1 号橋	桃源清水線	上河内町	RC 床版橋	10	5.2	平成 19 年	Ⅰ	5	2018
165	東清水北橋	北中沢線	東清水町	鋼 RC 橋	13.8	8.2	昭和 48 年	Ⅰ	5	2017
166	尾花下橋	尾花3号線	尾花町	RC 床版橋	8.95	3.4	昭和 49 年	Ⅰ	5	2017
167	東陽中南橋(既存部)	東陽中東線	川島町	PC 橋	10.85	11.3	平成 07 年	Ⅰ	5	2017
168	二口橋	上戸ノ口三峰線	上戸口町	Box-C	8.4	7.2	平成 27 年	Ⅰ	5	2017
169	南井南 1 号橋	南井南線	四方谷町	PC 橋	8.2	7.1	昭和 47 年	Ⅰ	5	2017
170	北野 7 号橋	三六 9 号線	北野町	RC 床版橋	4.9	6.6	昭和 58 年	Ⅲ	20	2017
171	立待小学校南橋	杉本西番線	杉本町	RC 床版橋	2.8	7.7	昭和 49 年	Ⅲ	20	2017
172	小黒町 10 号橋	小黒町有定線	桜町	RC 床版橋	2.8	11.5	昭和 48 年	Ⅲ	20	2017
173	水落 1 号橋	鯖浦線	水落町	RC 床版橋	4.2	16.2	昭和 48 年	Ⅲ	20	2017
174	水落 4 号橋	下河端水落 2 号線	水落町 3 丁目	RC 床版橋	3.4	7.9	昭和 47 年	Ⅲ	20	2017
175	向出橋	上戸ノ口 4 号線	上戸口町	RC 床版橋	4.3	4	昭和 50 年	Ⅲ	0	2016
176	当田2号橋	石生谷熊田線	当田町	RC 橋	5.5	7.65	昭和 43 年	Ⅲ	0	2017
177	小黒町 4 号橋	長泉寺山トンネル線	小黒町	PC 橋	5.4	17.6	昭和 58 年	Ⅱ	30	2015
178	舟津2号橋	舟津幹線	上鯖江町	Box-C	2.5	16.1	昭和 49 年	Ⅱ	30	2015
179	五郎丸 3 号橋	白鬼女下新庄線	五郎丸町	RC 床版橋	3.2	16	昭和 55 年	Ⅱ	30	2015
180	当田南橋	下野田下司線	当田町	RC 床版橋	5.6	7.4	昭和 44 年	Ⅱ	25	2015
181	高専 1 号橋	高専線	下司町	RC 床版橋	2.4	17.4	昭和 45 年	Ⅱ	25	2015
182	舟枝 2 号橋	舟枝乙坂線	中野町	RC 床版橋	2.8	6.6	昭和 49 年	Ⅱ	25	2015
183	上氏家橋	下野田下司線	上氏家町	RC 床版橋	4.5	7.7	昭和 43 年	Ⅱ	25	2015
184	舟枝 1 号橋	舟枝乙坂線	吉谷町	RC 床版橋	2.5	7.7	昭和 49 年	Ⅱ	25	2015
185	鯖江駅東橋	鯖江駅東線	横江町 2 丁目	RC 床版橋	4	19.6	昭和 48 年	Ⅱ	25	2015
186	小黒町 9 号橋	小黒町有定線	有定町 3 丁目	Box-C	3	8	昭和 48 年	Ⅱ	20	2017
187	桜町橋	桜町 16 号線	桜町	RC 床版橋	2.8	11.35	昭和 56 年	Ⅱ	20	2017
188	有定 1 号橋	有定 13 号線	有定町 1 丁目	RC 床版橋	3.1	7	昭和 41 年	Ⅱ	20	2017
189	住吉南橋	住吉王山線	住吉町 2 丁目	RC 床版橋	2.2	16	昭和 45 年	Ⅱ	20	2017
190	小黒町 2 号橋	小黒町 15 号線	小黒町	RC 床版橋	3.5	6.7	昭和 47 年	Ⅱ	20	2017
191	有定 3 号橋	有定 2 号線	有定町 1 丁目	RC 床版橋	3	7.85	昭和 41 年	Ⅱ	20	2017
192	小黒町 7 号橋	小黒町 8 号線	小黒町	RC 床版橋	3.55	4.95	昭和 48 年	Ⅱ	20	2017
193	小黒町 3 号橋	小黒町 13 号線	小黒町	RC 床版橋	4.95	4.4	昭和 47 年	Ⅱ	20	2017
194	水落 3 号橋	霊北 14 号線	水落町	RC 床版橋	3.4	8	昭和 48 年	Ⅱ	20	2017
195	北野 6 号橋	北野 3 号線	北野町	RC 床版橋	4.5	6	昭和 53 年	Ⅱ	20	2017
196	小黒町 8 号橋	小黒町 7 号線	小黒町	RC 床版橋	3.55	5	昭和 48 年	Ⅱ	20	2017
197	杉本 4 号橋	杉本 6 号線	杉本町	RC 床版橋	2.4	9.2	昭和 44 年	Ⅱ	20	2017
198	糺 4 号橋	三六 14 号線	糺町	RC 床版橋	4.9	6.6	昭和 58 年	Ⅱ	20	2017
199	糺 3 号橋	糺 3 号線	糺町	RC 床版橋	4.5	6.8	昭和 46 年	Ⅱ	20	2017
200	杉本西 1 号橋	杉本 31 号線	杉本町	RC 床版橋	4.7	5.5	昭和 58 年	Ⅱ	20	2017
201	小黒町 11 号橋	有定 22 号線	小黒町	RC 床版橋	2.1	13.1	昭和 48 年	Ⅱ	20	2017
202	丸山 5 号橋	北部循環線	杉本町	RC 橋	2.4	19.5	昭和 46 年	Ⅱ	20	2017
203	北野 4 号橋	北野 23 号線	北野町	RC 床版橋	4.5	6.7	昭和 50 年	Ⅱ	20	2017
204	舟津西区画橋	舟津西区画 1 号線	舟津町 4 丁目	Box-C	3.4	6.6	平成 07 年	Ⅱ	20	2017
205	丸山 2 号橋	丸山 19 号線	丸山町 3 丁目	RC 床版橋	2.2	9.1	昭和 45 年	Ⅱ	20	2017
206	杉本 5 号橋	杉本 14 号線	杉本町	RC 床版橋	2.4	8.7	昭和 44 年	Ⅱ	20	2017
207	杉本 7 号橋	杉本 10 号線	杉本町	RC 床版橋	2.4	9.85	昭和 46 年	Ⅱ	20	2017
208	小黒町 12 号橋	小黒町 27 号線	小黒町	RC 床版橋	3.6	4.5	昭和 47 年	Ⅱ	20	2017
209	西番 4 号橋	西番 7 号線	西番町	RC 床版橋	5.15	4.5	昭和 42 年	Ⅱ	20	2017
210	西番 3 号橋	浅水川左岸堤防線	西番町	RC 床版橋	5.3	5.05	昭和 42 年	Ⅱ	20	2017
211	小黒町 5 号橋	小黒町 11 号線	小黒町	RC 床版橋	3.6	5.05	昭和 47 年	Ⅱ	20	2017
212	杉本 3 号橋	杉本 4 号線	杉本町	RC 床版橋	2.7	9.15	昭和 44 年	Ⅱ	20	2017
213	杉本 2 号橋	糺 13 号線	杉本町	RC 床版橋	4.6	5.55	昭和 44 年	Ⅱ	20	2017
214	北野 2 号橋	北野 20 号線	杉本町	RC 床版橋	4	7.1	昭和 51 年	Ⅱ	20	2017
215	杉本西 2 号橋	杉本 30 号線	杉本町	RC 床版橋	4.7	3.3	昭和 58 年	Ⅱ	20	2017
216	北野 1 号橋	北野 11 号線	北野町	RC 床版橋	4.55	6	昭和 51 年	Ⅱ	20	2017
217	北野 3 号橋	北野線	北野町	RC 床版橋	4.5	15.95	昭和 51 年	Ⅱ	20	2017
218	小泉2号橋	小泉4号線	小泉町	RC 床版橋	2.2	6.7	昭和 47 年	Ⅱ	15	2015
219	杉本9号橋	吉江中上杉本線	杉本町	RC 床版橋	5.2	15	不明	Ⅱ	15	2015
220	磯部南橋	磯部中戸ノ口線	磯部町	RC 床版橋	4.1	9.9	昭和 35 年	Ⅱ	10	2015
221	椿坂中橋	西袋寺中線	西袋町	RC 床版橋	2.1	10.5	昭和 49 年	Ⅱ	10	2015
222	高橋	西袋寺中線	西袋町	RC 床版橋	4.1	9	昭和 51 年	Ⅱ	10	2015
223	元前田 3 号橋	中野北中山線	中野町	Box-C	3.9	7.9	不明	Ⅱ	10	2017
224	西番橋	吉江西番線	西番町	RC 橋	5	8.25	昭和 43 年	Ⅱ	10	2015
225	横江 3 号橋	横江 5 号線	横江町 2 丁目	RC 床版橋	3.6	8.75	昭和 47 年	Ⅱ	5	2017
226	横江 2 号橋	新横江線	横江町 2 丁目	RC 床版橋	3.8	9.65	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
227	五郎丸南3号橋	上鯖江定次線	五郎丸町	RC 床版橋	3.6	9.8	昭和 47 年	Ⅱ	5	2017
228	東鯖江北3号橋	東鯖江4号線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.5	6	昭和 49 年	Ⅱ	5	2017
229	五郎丸 2 号橋	五郎丸 4 号線	定次町	RC 床版橋	3.25	7.6	昭和 54 年	Ⅱ	5	2016
230	住吉南 4 号橋	住吉 21 号線	住吉町 3 丁目	RC 床版橋	2.2	11.8	不明	Ⅱ	5	2016
231	五郎丸5号橋	五郎丸6号線	五郎丸町	RC 床版橋	5	6.1	昭和 53 年	Ⅱ	5	2017
232	東鯖江北2号橋	北鯖江定次線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.5	16.5	昭和 49 年	Ⅱ	5	2017
233	柳町10号橋	横江柳町1号線	柳町 4 丁目	RC 床版橋	2.6	7.2	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
234	五郎丸南 1 号橋	五郎丸 7 号線	五郎丸町	RC 床版橋	3	4.15	昭和 33 年	Ⅱ	5	2016
235	東鯖江1号橋	東鯖江柳町1号線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.5	6.1	昭和 47 年	Ⅱ	5	2017
236	東鯖江北1号橋	東鯖江上河端1号線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.5	6	昭和 49 年	Ⅱ	5	2017
237	西番 2 号橋	西番 6 号線	西番町	RC 床版橋	4.75	6.05	昭和 42 年	Ⅱ	5	2016
238	横江 1 号橋	横江柳町 1 号線	横江町 2 丁目	RC 床版橋	3.5	9.65	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長	幅員	架設年	健全度判定	重要度評点	前回点検年度
239	五郎丸8号橋	定次五郎丸線	五郎丸町	RC 床版橋	3.9	6	昭和 50 年	Ⅱ	5	2017
240	小黒西橋	小黒町 26 号線	小黒町	Box-C	4.7	11.2	不明	Ⅱ	5	2016
241	西山ﾆｭｰﾀｳﾝ橋	小黒町南線	小黒町	RC 床版橋	3.5	9.65	昭和 58 年	Ⅱ	5	2016
242	住吉南 3 号橋	住吉 7 号線	住吉町 3 丁目	RC 床版橋	2.2	10.6	不明	Ⅱ	5	2016
243	西鳥羽 2 号橋	鳥羽 7 号線	鳥羽町	RC 橋	2.3	13.725	不明	Ⅱ	5	2016
244	小黒町 1 号橋	霊北 13 号線	水落町	RC 床版橋	3.5	8	昭和 47 年	Ⅱ	5	2016
245	丸山 3 号橋	丸山 20 号線	丸山町 3 丁目	RC 床版橋	2.2	11.3	昭和 45 年	Ⅱ	5	2016
246	丸山 4 号橋	丸山 22 号線	丸山町 3 丁目	RC 床版橋	2.2	6.9	昭和 46 年	Ⅱ	5	2016
247	舟津 1 号橋	舟津 10 号線	上鯖江町	Box-C	3.5	6	昭和 45 年	Ⅱ	5	2017
248	有定 2 号橋	御殿有定線	有定町 1 丁目	RC 床版橋	2.9	7.2	昭和 41 年	Ⅱ	5	2016
249	糺橋	糺 8 号線	糺町	RC 床版橋	4.5	6.5	昭和 46 年	Ⅱ	5	2016
250	下河端区画 4 号橋	下河端区画 13 号線	下河端町	Box-C	4.2	14.4	平成 15 年	Ⅱ	5	2017
251	東鯖江4号橋	東鯖江 11 号線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.5	6	昭和 48 年	Ⅱ	5	2017
252	柳町 9 号橋	柳町 32 号線	柳町 2 丁目	RC 床版橋	2.9	3.6	昭和 40 年	Ⅱ	5	2016
253	住吉橋	住吉 24 号線	住吉町 3 丁目	RC 床版橋	2.4	11.8	昭和 45 年	Ⅱ	5	2016
254	住吉北橋	住吉 13 号線	住吉町 3 丁目	RC 床版橋	2.5	9.9	昭和 46 年	Ⅱ	5	2016
255	新横江団地橋	新横江団地 10 号線	東鯖江町	RC 床版橋	3.3	8.1	昭和 46 年	Ⅱ	5	2017
256	下河端区画 2 号橋	下河端区画 11 号線	下河端町	Box-C	4.1	15	平成 15 年	Ⅱ	5	2017
257	上河端第一橋	東鯖江上河端線	東鯖江 4 丁目	RC 床版橋	3.9	8.6	昭和 42 年	Ⅱ	5	2017
258	長泉寺3号橋	長泉寺 6 号線	長泉寺町	RC 床版橋	4.2	4.675	昭和 39 年	Ⅱ	5	2016
259	柳町 3 号橋	柳町 15 号線	柳町 3 丁目	RC 床版橋	5	4.5	昭和 39 年	Ⅱ	5	2016
260	東鯖江3号橋	東鯖江柳町 3 号線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.6	13.5	昭和 47 年	Ⅱ	5	2017
261	二ノ和田 2 号橋	相生和田線	和田町	RC 橋	4.3	6.05	平成 6 年	Ⅱ	0	2016
262	上氏家1号橋	上氏家4号線	上氏家町	RC 床版橋	5.7	6	昭和 42 年	Ⅱ	0	2017
263	坂下橋	上戸ノ口4号線	上戸口町	RC 床版橋	3.3	3.1	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
264	和田 3 号橋	日中山下野田線	和田町	RC 橋	4.5	6.15	昭和 45 年	Ⅱ	0	2016
265	別司西4号橋(既存部)	別司14号線	別司町	RC 床版橋	5.3	5.7	平成 07 年	Ⅱ	0	2017
266	和田 2 号橋	青野和田線	和田町	RC 橋	4.5	6.15	昭和 45 年	Ⅱ	0	2016
267	川去北 2 号橋	川去北 3 号線	川去町	RC 床版橋	3.9	6	昭和 63 年	Ⅱ	0	2017
268	平井 3 号橋	平井 6 号線	平井町	RC 床版橋	2.2	8.2	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
269	石田下西橋	石田堤防線	石田下町	Box-C	2.4	6.3	昭和 38 年	Ⅱ	0	2016
270	川去北 1 号橋	川去北 1 号線	川去町	RC 床版橋	2.4	4.3	昭和 40 年	Ⅱ	0	2016
271	鯖浦8号橋	鯖浦自転車道線	田村町	PC 橋	5.8	4	昭和 59 年	Ⅱ	0	2017
272	論手4号橋	西大井学校線	田村町	PC 橋	4.9	4	昭和 45 年	Ⅱ	0	2017
273	神社橋	小泉 6 号線	小泉町	RC 床版橋	2.6	5.3	昭和 41 年	Ⅱ	0	2017
274	大正寺橋	大正寺新線	南井町	RC 床版橋	2.7	7	昭和 40 年	Ⅱ	0	2016
275	小泉 1 号橋	小泉 3 号線	小泉町	RC 床版橋	2.4	11.4	昭和 47 年	Ⅱ	0	2017
276	吉光橋	大倉 1 号線	大倉町	RC 床版橋	3.8	3.95	昭和 45 年	Ⅱ	0	2017
277	論手 3 号橋	西大井平井線	冬島町	Box-C	2.9	6.8	昭和 45 年	Ⅱ	0	2017
278	小泉 3 号橋	石田上当田線	小泉町	Box-C	2.5	7	昭和 54 年	Ⅱ	0	2017
279	赤川5号橋	平井6号線	平井町	RC 床版橋	5	6.4	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
280	当田北橋	石田上当田線	当田町	Box-C	2.8	5.2	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
281	赤川 2 号橋	平井 1 号線	平井町	PC 橋	4.3	4.6	昭和 42 年	Ⅱ	0	2017
282	尾花上橋	尾花5号線	尾花町	RC 床版橋	5.4	3.4	昭和 45 年	Ⅱ	0	2017
283	舟枝 5 号橋	舟枝 4 号線	舟枝町	RC 床版橋	4.3	4.7	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
284	当田 1 号橋	石生谷熊田線	当田町	Box-C	2.9	8.45	昭和 43 年	Ⅱ	0	2017
285	西大井 1 号橋	西大井川去線	西大井町	RC 床版橋	4.7	13.3	昭和 56 年	Ⅱ	0	2017
286	西袋3号橋	西袋17号線	西袋町	RC 床版橋	5.7	4.6	昭和 48 年	Ⅱ	0	2017
287	西大井 3 号橋	西大井持明寺線	西大井町	Box-C	2.9	6.6	昭和 56 年	Ⅱ	0	2017
288	西大井 4 号橋	西大井平井線	西大井町	RC 橋	4	8.35	不明	Ⅱ	0	2016
289	西袋 1 号橋(既存部)	西袋4号線	西袋町	RC 床版橋	4.4	9.7	昭和 48 年	Ⅱ	0	2017
290	機械工業団地橋	鯖江市二丁掛東団地 1 号線	当田町	RC 床版橋	2.5	13.5	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
291	平井北橋	平井北線	平井町	RC 床版橋	2.35	8.05	昭和 50 年	Ⅱ	0	2017
292	別司西 3 号橋	別司 12 号線	別司町	RC 床版橋	5.65	4.2	昭和 28 年	Ⅱ	0	2016
293	高速側道横越3号橋	高速側道2号線	横越町	RC 床版橋	3	5.9	昭和 47 年	Ⅱ	0	2017
294	五郎丸南 2 号橋	五郎丸 7 号線	五郎丸町	RC 床版橋	4	4.45	昭和 33 年	Ⅱ	0	2016
295	高専 2 号橋	青武台6号線	下司町	RC 床版橋	3.3	6.85	昭和 45 年	Ⅱ	0	2017
296	下河端 4 号橋	下河端 8 号線	下河端町	RC 床版橋	3.6	8.7	昭和 39 年	Ⅱ	0	2016
297	平井1号橋	平井石田線	平井町	RC 床版橋	5.3	9.35	昭和 35 年	Ⅱ	0	2017
298	下河端 7 号橋	下河端 12 号線	下河端町	RC 床版橋	2.9	5.9	昭和 40 年	Ⅱ	0	2016
299	上河端北 2 号橋	上河端 7 号線	上河端町	RC 床版橋	5	7	昭和 39 年	Ⅱ	0	2016
300	下河端 3 号橋	下河端 7 号線	下河端町	RC 床版橋	3.55	5.65	昭和 39 年	Ⅱ	0	2016
301	陰土橋	上戸口中央線	上戸口町	RC 床版橋	5.8	7	昭和 28 年	Ⅱ	0	2016
302	四方谷橋	南井西線	四方谷町	Box-C	4.9	17.5	不明	Ⅱ	0	2017
303	小泉南橋	二丁掛小泉線	小泉町	RC 床版橋	3.6	4.05	昭和 40 年	Ⅱ	0	2017
304	下河端 1 号橋	下河端 2 号線	下河端町	RC 床版橋	4.9	4.8	昭和 39 年	Ⅱ	0	2016
305	下河端 2 号橋	下河端 7 号線	下河端町	RC 床版橋	3.5	6.5	昭和 39 年	Ⅱ	0	2016
306	落井西 1 号橋	落井 8 号線	落井町	RC 床版橋	3.8	6.8	昭和 35 年	Ⅱ	0	2016
307	河端神社橋	徳尾下河端線	下河端町	RC 床版橋	5.8	2.7	昭和 48 年	Ⅱ	0	2016
308	落井西2号橋	落井9号線	落井町	RC 床版橋	3.6	4.5	昭和 35 年	Ⅱ	0	2017
309	下河端区画染東橋	染東線	下河端町	Box-C	3.6	27	平成 15 年	Ⅰ	30	2015
310	上河内中橋	上河内清根線	上河内町	RC 床版橋	3.8	4.7	不明	Ⅰ	25	2016
311	小黒町 6 号橋	小黒町 10 号線	小黒町	RC 橋	3.6	6.2	昭和 47 年	Ⅰ	20	2017
312	石田北 2 号橋	石田上 12 号線	石田上町	RC 床版橋	2.2	6.9	昭和 55 年	Ⅰ	15	2017
313	椿坂上橋	西袋 3 号線	西袋町	RC 床版橋	2.9	2.8	昭和 40 年	Ⅰ	15	2016
314	下出橋	西袋寺中線	寺中町	RC 床版橋	3.4	4.5	昭和 28 年	Ⅰ	10	2015
315	乙坂2号橋	舟枝乙坂線	乙坂今北町	RC 床版橋	3.9	6.6	昭和 50 年	Ⅰ	10	2015
316	五郎丸 4 号橋	五郎丸 5 号線	五郎丸町	RC 床版橋	3.2	6	昭和 53 年	Ⅰ	5	2016
317	五郎丸 1 号橋	宮前 6 号線	定次町	Box-C	3	7	不明	Ⅰ	5	2016
318	柳町 7 号橋	柳町 12 号線	柳町 2 丁目	RC 床版橋	4	7.5	昭和 39 年	Ⅰ	5	2016

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長	幅員	架設年	健全度判定	重要度評点	前回点検年度
319	水落 2 号橋	丸山北野線	水落町	RC 床版橋	3.5	14.1	昭和 48 年	I	5	2016
320	五郎丸7号橋	五郎丸宮前線	五郎丸町	RC 床版橋	3.9	6	昭和 50 年	I	5	2017
321	柳町 1 号橋	柳町 13 号線	柳町 3 丁目	Box-C	3.4	5.8	昭和 39 年	I	5	2016
322	柳町 2 号橋	柳町 14 号線	柳町 1 丁目	RC 床版橋	4.2	8.8	昭和 39 年	I	5	2016
323	東鯖江2号橋	東鯖江 10 号線	東鯖江 2 丁目	RC 床版橋	3.5	6	昭和 47 年	I	5	2017
324	舟津区画 4 号橋	鯖江瓜生線	舟津町 4 丁目	Box-C	2.9	12	不明	I	5	2016
325	舟津 3 号橋	舟津 14 号線	上鯖江町	RC 床版橋	2.2	3.6	昭和 35 年,平成 28 年拡幅	I	5	2016
326	宮前橋	宮前5号線	宮前 2 丁目	Box-C	3.1	8.5	昭和 52 年	I	5	2017
327	下河端区画 9 号橋	下河端区画 9 号線	下河端町	Box-C	4.1	15	平成 15 年	I	5	2017
328	住吉南 2 号橋	住吉 8 号線	住吉町 2 丁目	RC 床版橋	2.4	10.9	不明	I	5	2016
329	有定 4 号橋	有定 2 号線	有定町 3 丁目	RC 床版橋	2.1	14.1	不明	I	5	2016
330	舟津区画 1 号橋	舟津区画 4 号線	舟津町 4 丁目	Box-C	2.9	9	不明	I	5	2016
331	杉本 11 号橋	上杉本幹線	杉本町	RC 床版橋	4.2	5.7	不明	I	5	2016
332	舟津区画 2 号橋	舟津区画 4 号線	舟津町 4 丁目	Box-C	2.9	11.15	不明	I	5	2016
333	舟津区画 3 号橋	舟津区画 5 号線	舟津町 4 丁目	Box-C	3.1	8.5	不明	I	5	2016
334	下河端区画 1 号橋	下河端区画 1 号線	下河端町	Box-C	4.1	8.15	平成 16 年	I	5	2017
335	柳町 5 号橋	東鯖江柳町 1 号線	柳町 2 丁目	RC 床版橋	3.4	5.1	昭和 38 年	I	5	2016
336	下河端区画 3 号橋	下河端区画 12 号線	下河端町	Box-C	4.1	21	平成 15 年	I	5	2017
337	柳町6号橋	柳町9号線	柳町 2 丁目	RC 床版橋	4	3	平成 28 年	I	5	2017
338	杉本橋	杉本鳥羽線	杉本町	RC 床版橋	4.5	5.95	不明	I	5	2016
339	五郎丸6号橋	上鯖江定次線	五郎丸町	RC 床版橋	3.8	9.1	昭和 41 年	I	5	2017
340	柳町 8 号橋	柳町 11 号線	柳町 2 丁目	RC 床版橋	3.1	7.1	昭和 40 年, 拡幅年不明	I	5	2016
341	柳町 4 号橋	東鯖江柳町 1 号線	柳町 4 丁目	RC 床版橋	2.2	6	昭和 38 年	I	5	2016
342	長泉寺2号橋	長泉寺 15 号線	長泉寺町	RC 床版橋	4.4	7.725	昭和 39 年	I	5	2016
343	西光寺橋(既存部)	杉本 23 号線	杉本町	RC 床版橋	2.8	5.1	昭和 47 年	I	5	2017
344	柳町 11 号橋	柳町 8 号線	柳町 4 丁目	RC 床版橋	2.8	9.9	昭和 40 年, 拡幅年不明	I	5	2016
345	ニュータウン川去橋	川去 14 号線	川去町	RC 床版橋	5	9.8	不明	I	0	2017
346	下司3号橋	下司4号線	下司町	RC 床版橋	2	10.7	昭和 62 年	I	0	2017
347	平井4号橋	平井団地 16 号線	平井町	RC 床版橋	5.2	3.3	昭和 43 年	I	0	2017
348	大倉西 1 号橋	二丁掛石田線	大倉町	RC 床版橋	4.95	5.4	昭和 48 年	I	0	2017
349	当田中橋	下氏家7号線	当田町	RC 床版橋	2.5	7	昭和 59 年	I	0	2017
350	川去北 3 号橋	川去 15 号線	川去町	RC 床版橋	2.5	3.9	昭和 40 年	I	0	2016
351	別司東1号橋	別司 1 号線	別司町	RC 床版橋	3.8	4.35	昭和 45 年	I	0	2017
352	川去北 5 号橋	川去 18 号線	川去町	RC 床版橋	2.45	5.7	不明	I	0	2016
353	高速側道横越 1 号橋	高速側道横越 1 号線	横越町	RC 床版橋	4.8	5.7	昭和 47 年	I	0	2017
354	11ケ用水橋	当田下氏家線	鳥井町	RC 床版橋	5	8.9	昭和 62 年	I	0	2017
355	小泉西橋	二丁掛石田線	小泉町	RC 床版橋	4.3	5.4	昭和 48 年	I	0	2017
356	高速側道横越5号橋	高速側道5号線	横越町	RC 床版橋	5.1	10.6	昭和 50 年	I	0	2017
357	下河端 10 号橋	下河端 21 号線	下河端町	RC 床版橋	3	5.6	平成 08 年	I	0	2016
358	川去北橋	川去 12 号線	川去町	RC 床版橋	2.4	6.05	昭和 45 年	I	0	2017
359	戸ノ口中橋	中戸ノ口7号線	中戸口町	RC 床版橋	3.1	5.6	平成 01 年	I	0	2017
360	大正寺2号橋	大正寺線	大正寺町	RC 床版橋	4.4	6.1	昭和 62 年	I	0	2017
361	鳥井下橋	鳥井熊田線	鳥井町	RC 床版橋	2.8	17.6	昭和 61 年	I	0	2017
362	舟枝6号橋	舟枝5号線	舟枝町	RC 床版橋	2.75	4.6	昭和 51 年	I	0	2017
363	西大井北橋	田村西大井線	西大井町	RC 床版橋	5.6	4.9	昭和 53 年	I	0	2017
364	二丁掛南4号橋	二丁掛6号線	二丁掛町	RC 床版橋	2.1	5	昭和 62 年	I	0	2017
365	上氏家3号橋	上氏家・漆原2号線	上氏家町	RC 床版橋	4.75	7.9	昭和 60 年	I	0	2017
366	乙坂1号橋	乙坂1号線	乙坂今北町	RC 床版橋	3.8	6.8	昭和 63 年	I	0	2017
367	莇生田南橋	莇生田5号線	莇生田町	RC 床版橋	3	9.95	昭和 43 年	I	0	2017
368	下河端 8 号橋	下河端 13 号線	下河端町	RC 床版橋	2.9	5.65	昭和 40 年	I	0	2016
369	別司東3号橋	別司3号線	別司町	Box-C	3.4	7.15	昭和 45 年	I	0	2017
370	別司西2号橋	別司6号線	別司町	RC 床版橋	2.9	5.9	昭和 41 年	I	0	2017
371	別司西 1 号橋	別司 8 号線	別司町	Box-C	3.4	5.3	平成 23 年	I	0	2016
372	別司東2号橋	別司9号線	別司町	Box-C	3.4	8	昭和 43 年	I	0	2017
373	石生谷4号橋	青野和田線	石生谷町	Box-C	2.4	6.6	昭和 46 年	I	0	2017
374	当田西橋	当田下氏家線	当田町	Box-C	3.5	6	昭和 46 年	I	0	2017
375	小坂出橋	上戸ノ口5号線	上戸口町	RC 床版橋	3.2	6.3	昭和 50 年	I	0	2017
376	上氏家2号橋	上氏家3号線	上氏家町	RC 床版橋	4.7	10.7	昭和 42 年	I	0	2017
377	当田橋	当田4号線	当田町	RC 床版橋	5.3	5.6	昭和 60 年	I	0	2017
378	和田 1 号橋	青野山室線	石生谷町	RC 床版橋	3.75	5.95	昭和 45 年	I	0	2016
379	下司2号橋	下司鳥井線	下司町	RC 床版橋	2.7	4.05	昭和 60 年	I	0	2017
380	熊田北橋	熊田平井線	熊田町	RC 床版橋	3.5	5	昭和 41 年,拡幅年不明	I	0	2016
381	乙坂北橋	乙坂大野線	別所町	RC 床版橋	4.5	6.3	昭和 47 年	I	0	2017
382	大野南1号橋	別所中央線	大野町	RC 床版橋	5.8	7	昭和 48 年	I	0	2017
383	南井1号橋	南井7号線	南井町	RC 床版橋	5.3	9.3	昭和 47 年	I	0	2017
384	薬師堂橋	下新庄 12 号線	下新庄町	RC 床版橋	2.5	4.9	不明	I	0	2017
385	新村西橋	高速側道 1 号線	新町	RC 床版橋	4	5.7	昭和 47 年	I	0	2017
386	高速側道横越 2 号橋	高速側道 1 号線	横越町	RC 床版橋	3.1	9.8	昭和 47 年	I	0	2017
387	高速側道横越4号橋	高速側道2号線	横越町	RC 床版橋	5.6	5.8	昭和 46 年	I	0	2017
388	花出橋	原 7 号線	中野町	RC 床版橋	3.9	3.4	昭和 30 年	I	0	2016
389	舟枝4号橋	舟枝3号線	舟枝町	RC 床版橋	4.3	5.6	昭和 49 年	I	0	2017
390	下河端 6 号橋	下河端 17 号線	下河端町	RC 床版橋	2.9	5.025	昭和 40 年	I	0	2016
391	下河端 9 号橋	下河端 4 号線	下河端町	RC 床版橋	2.9	5.1	昭和 51 年	I	0	2016
392	下河端 5 号橋	下河端 9 号線	下河端町	RC 床版橋	2.95	5.95	昭和 40 年	I	0	2016
393	下司1号橋	下司2号線	下司町	RC 床版橋	3	5.5	昭和 60 年	I	0	2017
394	寺中橋	寺中 5 号線	寺中町	Box-C	2	7.15	昭和 28 年	I	0	2016
395	当田上橋	当田下氏家線	当田町	Box-C	2.5	6	昭和 58 年	I	0	2017
396	岡山西橋	上氏家西1号線	上氏家町	RC 床版橋	2.6	9.35	昭和 59 年	I	0	2017
397	戸ノ口南橋	戸ノ口9号線	戸口町	RC 床版橋	2.7	7	昭和 50 年	I	0	2017
398	石田西 2 号橋	石田上中 3 号線	石田上町	RC 床版橋	2.2	4.9	昭和 39 年,拡幅年不明	I	0	2016

No	橋梁名	路線名	地係	橋種	橋長	幅員	架設年	健全度判定	重要度評点	前回点検年度
399	小泉橋	小泉 4 号線	小泉町	RC 床版橋	3	5.6	昭和 40 年	Ⅰ	0	2016
400	赤川7号橋	小泉日野川堤防線	小泉町	RC 床版橋	5.1	9.05	平成 01 年	Ⅰ	0	2017
401	赤川6号橋	平井団地北線	平井町	RC 床版橋	5	4.5	昭和 51 年	Ⅰ	0	2017
402	赤川 1 号橋	平井 5 号線	平井町	RC 橋	4.2	6.85	昭和 36 年,拡幅年不明	Ⅰ	0	2016
403	赤川 4 号橋	平井団地 7 号線	平井町	RC 床版橋	4.9	6.6	昭和 42 年	Ⅰ	0	2016
404	二つ屋橋	平井大倉 1 号線	平井町	RC 橋	2.2	9	不明	Ⅰ	0	2016
405	平井橋	平井大倉 1 号線	平井町	RC 橋	4.7	4.7	昭和 30 年,拡幅年不明	Ⅰ	0	2016
406	赤川3号橋	平井大倉1号線	平井町	RC 橋	5	8.3	昭和 42 年	Ⅰ	0	2017
407	石生谷2号橋	石生谷1号線	石生谷町	Box-C	3	6.5	昭和 46 年	Ⅰ	0	2017
408	熊田橋	熊田6号線	熊田町	RC 床版橋	4.875	3.4	昭和 42 年	Ⅰ	0	2017
409	石生谷1号橋	石生谷2号線	石生谷町	Box-C	3	4	昭和 46 年	Ⅰ	0	2017
410	西大井 2 号橋	西大井学校線	西大井町	Box-C	2.9	5.6	昭和 56 年	Ⅰ	0	2017
411	金谷橋	金谷 3 号線	金谷町	RC 床版橋	4.25	6.8	昭和 48 年	Ⅰ	0	2016
412	金谷東橋	金谷 3 号線	金谷町	RC 床版橋	3.5	7.9	昭和 36 年	Ⅰ	0	2016
413	金谷上橋	金谷 4 号線	金谷町	Box-C	2.9	8.35	昭和 36 年	Ⅰ	0	2016
414	北中東橋	北中3号線	北中町	RC 床版橋	4.5	5.9	昭和 52 年	Ⅰ	0	2017
415	論手1号橋	若葉西和台線	冬島町	RC 床版橋	4	6	昭和 45 年	Ⅰ	0	2017
416	二丁掛南2号橋	二丁掛2号線	二丁掛町	RC 床版橋	2.9	4.3	昭和 44 年	Ⅰ	0	2017
417	宮前橋	西袋 13 号線	西袋町	RC 床版橋	2.7	4.3	昭和 48 年	Ⅰ	0	2017
418	二丁掛南1号橋	二丁掛稲荷線	二丁掛町	RC 床版橋	2.5	7.5	昭和 45 年	Ⅰ	0	2017
419	二丁掛南3号橋	二丁掛2号線	二丁掛町	RC 床版橋	2.1	4.6	昭和 45 年	Ⅰ	0	2017
420	熊田下橋	熊田3号線	熊田町	RC 床版橋	4.2	5.15	昭和 43 年	Ⅰ	0	2017
421	憶念寺橋	寺中 4 号線	寺中町	RC 床版橋	4.2	3.85	昭和 28 年	Ⅰ	0	2016
422	大倉西橋	二丁掛小泉線	大倉町	RC 床版橋	5	5.1	昭和 41 年	Ⅰ	0	2017

５．長寿命化修繕計画に要する費用と効果

○ 今回計画を策定した橋梁については、概ね 10 年～40 年の延命が見込まれる。
○ 維持管理費の縮減効果については、今後 50 年間で 122.7 億円→63.6 億円（▲59.1 億円）となり、約 48%の縮減が見込まれる。（図－2 参照）

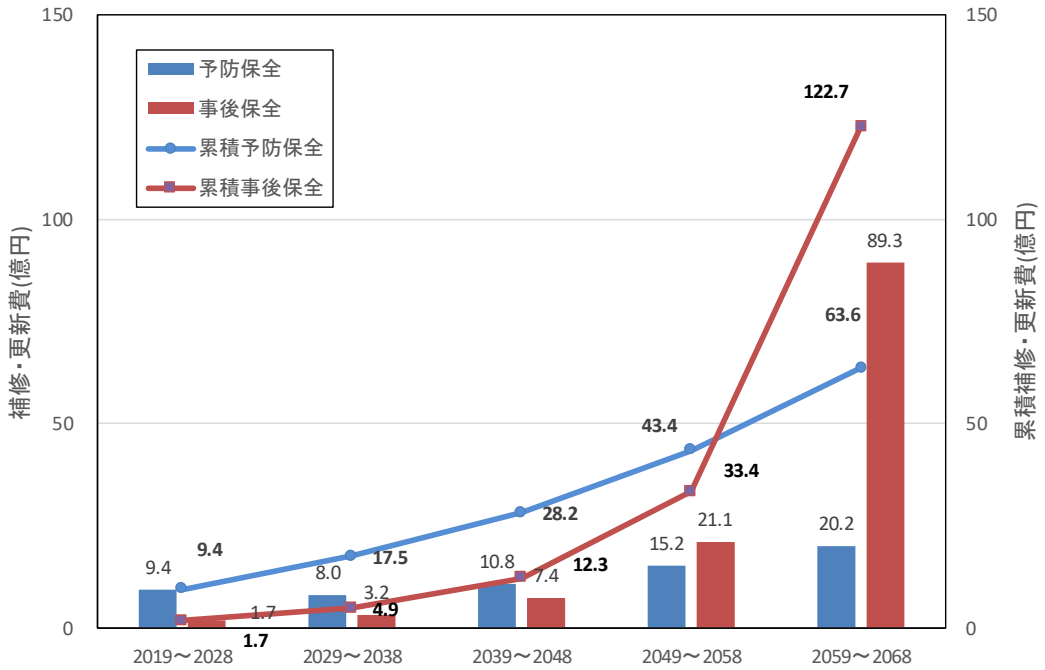

図-2　今後５０年の維持管理コストの比較

６．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
鯖江市都市整備部土木課　TEL:0778-53-2245

2. 維持管理計画 案-2

（1） 橋梁別 補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化　　※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　　※更新年(平準化)：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　　※欄内数値は、補修・更新の金額(単位：千円)　　凡例 ： 長寿命化 更新 塗替 伸縮装置交換 塗替+伸縮装置交換 部分補修　　※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年(西暦)	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年(平準化)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計(千円)
1	74	上河内橋	上河内清根線	RC橋+PC橋	10.50	7.70	昭和07年	1932			86	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2032															60,638																																										60,638
2	83	下河原橋	北中2号線	鋼RC橋	10.25	5.45	昭和20年	1945	2016	2016	73	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2045													864														41,897															864														43,626
3	109	西前田橋	河和田5号線	RC橋	8.30	3.30	昭和25年	1950			68	Ⅲ	10	長寿命化済み	100	2050		410	990																													20,543																								21,942
4	106	小門橋	河和田茚生田2号線	鋼RC橋	9.70	4.30	昭和26年	1951			67	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2051				1,956														666															31,283																	666			34,570
5	110	佐治広橋	河和田6号線	RC橋	8.40	3.85	昭和27年	1952			66	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2052	2051			1,155																											24,255																							25,410
6	66	御寺橋	落井4号線	RC橋	22.10	2.50	昭和27年	1952			66	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2052	2051			1,125																											41,438																							42,563
7	111	内島橋	河和田8号線	RC橋	8.60	3.80	昭和27年	1952			66	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2052	2051			1,140																											24,510																							25,650
8	20	新橋	別所川島線	鋼RC橋	20.80	4.60	昭和30年	1955		2012	63	Ⅱ	35	長寿命化済み	100	2055	2052								1,513														4,273											71,760																1,513			79,059
9	62	戸口大橋	北中戸ノ口線	RC床版橋	15.89	8.65	昭和33,拡幅不明年	1958		2012	60	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2058	2053																					3,893												103,086																			106,979
10	352	天神橋	北中戸ノ口線	RC床版橋	10.00	10.40	昭和33年	1958			60	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2058	2052				3,120																													78,000																			81,120
11	416	桜町2号橋	有定鳥羽線	Box-C	2.35	19.60	昭和34	1959			59	Ⅲ	45	長寿命化済み	100	2059	2051																															34,545																							34,545
12	236	日野川沿排水路橋	糺ﾆｭｰﾀｳﾝ2号線	鋼RC橋+RC橋	8.20	8.20	昭和35年，不明（拡幅）	1960			58	Ⅲ	10	長寿命化済み	100	2060	2054	313					3,459														999																50,430																	55,201
13	52	水門橋	鳥井日野川堤防線	鋼RC橋	40.20	4.30	昭和37年	1962			56	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2062	2056								5,340													2,760															129,645																	137,745
14	346	旭橋	鉱泉線	RC橋	7.45	4.50	昭和38年	1963			55	Ⅲ	20	長寿命化済み	100	2063	2055							1,350																													25,144																	26,494
15	305	持明寺橋	西大井平井線	RC床版橋	7.90	17.75	昭和38年	1963			55	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2063	2054						5,325																												105,169																			110,494
16	71	一本橋	曲木4号線	鋼RC橋	41.00	2.10	昭和39年	1964			54	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2064	2057									2,529													1,584																64,575														68,689
17	392	赤橋	上戸口中央線	RC床版橋	6.70	6.50	昭和39年	1964			54	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2064	2055							1,950																													32,663																	34,613
18	67	出口橋歩道橋	横越中野出口線	鋼RC橋	37.60	2.50	昭和40年	1965			53	Ⅲ	20	長寿命化済み	100	2065	2062														3,158														1,658																		70,500					75,316
19	40	出口橋	横越中野出口線	RC橋+PC橋	37.90	9.70	昭和40（本橋），昭和60（拡幅）年	1965		2015	53	Ⅲ	20	長寿命化済み	100	2065	2061																										5,820																	275,723							281,543
20	23	野原橋	戸ノ口7号線	鋼RC橋	17.95	3.60	昭和40年	1965		2013	53	Ⅱ	25	長寿命化済み	100	2065	2057									1,061														2,141															48,465													51,667
21	18	葦ヶ淵橋	莇生田8号線	鋼RC橋	16.30	4.80	昭和40年	1965	2011	2011	53	Ⅱ	25	長寿命化済み	100	2065	2058								1,230													2,670																58,680													62,580
22	88	坂上橋	西袋寺中線	鋼RC橋	6.20	6.70	昭和40年	1965	2017		53	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2065	2058														629														2,639											31,155													34,422
23	63	津子出橋	戸ノ口1号線	鋼RC橋	19.05	3.00	昭和40年	1965	2017		53	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2065	2056														970														970											42,863													44,803
24	365	沢橋	沢5号線	RC橋	9.00	4.60	昭和40年	1965			53	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2065	2057									1,380																												31,050													32,430
25	38	曲木橋	上河端橋立線	RC橋	33.80	6.65	昭和41年	1966		2011	52	Ⅱ	25	長寿命化済み	100	2066	2063																						3,990																								168,578					172,568
26	317	荒子橋	石田和田橋線	RC橋+PC橋	12.70	8.60	昭和41年，拡幅不明	1966		2016	52	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2066	2064																											2,580																			81,915				84,495
27	39	狐橋	東鯖江上河端線	PC橋	36.85	6.00	1966年	1966		2015	52	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2066	2060																										2,700															165,825									168,525

（1） 橋梁別　補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　※欄内数値は、補修・更新の金額(単位：千円)

※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　凡例　：　長寿命化　更新　※更新年(平準化)：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの　塗替　伸縮装置交換　塗替+伸縮装置交換　部分補修　※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年(西暦)	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年(平準化)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計(千円)
28	35	仲屋橋	上河端新出2号線	鋼RC橋	29.80	4.60	昭和42年	1967			51	Ⅲ	10	長寿命化済み	100	2067	2065	1,198	2,168															4,238																2,168														102,810				112,581
29	65	東公園橋	横越7号線	鋼RC橋	24.70	3.00	昭和42年	1967	2018		51	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2067	2062														1,258												2,158																55,575							58,990
30	34	坊主橋	上河端新出1号線	鋼RC橋	29.80	3.60	昭和42年	1967			51	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2067	2059										3,381														1,761															80,460										85,603
31	36	榛木橋	上河端新出3号線	鋼RC橋	32.50	3.60	昭和42年	1967			51	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2067	2064		1,921													3,541												1,921																		87,750				95,133
32	3	新横江橋	新町新横江線	鋼RC橋	17.40	6.80	昭和42年	1967			51	Ⅰ	25	長寿命化済み	100	2067	2059										3,828														1,788															88,740										94,356
33	354	下野田北橋	下野田18号線	PC橋	8.60	5.70	昭和42年	1967			51	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2067	2065																1,710																														36,765				38,475
34	403	溜池橋	鳥井3号線	RC橋	8.20	3.60	昭和43年	1968			50	Ⅲ	5	長寿命化済み	100	2068																				1,080																													22,140		23,220
35	401	水落東1号橋	水落東11号線	PC橋	15.90	9.20	不明				50	Ⅱ	30	長寿命化済み	100	2068	2066																	2,760																													109,710			112,470
36	64	小山橋	戸ノ口3号線	鋼RC橋	16.20	2.65	不明		2014		50	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2068	2063										748														1,940																					32,198					34,885
37	56	余田橋	西大井持明寺線	鋼RC橋	15.10	7.80	昭和43(本橋)、平成01(拡幅)年	1968		2013	50	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2068	2066									1,758														4,098															1,758								88,335			95,948
38	33	広瀬橋	舟枝上河端線	鋼RC橋	37.80	4.25	昭和43年	1968		2012	50	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2068	2067								2,569														4,482												2,569													120,488		130,108
39	53	河端橋	岩立冬島線	鋼RC橋	20.50	4.70	昭和43年	1968			50	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2068	2067				1,519														2,929														1,519														72,263		78,230
40	312	神通橋	川去5号線	Box-C	13.00	18.20	昭和43年	1968			50	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2068																																																	177,450	177,450
41	339	当田3号橋	石生谷熊田線	RC床版橋	6.70	8.10	昭和43年	1968			50	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2068	2065																2,430																													40,703				43,133
42	349	大下田橋	河和田15号線	鋼RC橋	12.70	5.70	不明				50	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2068	2058									2,824														1,114															54,293										58,231
43	348	東清水西橋	東清水6号線	PC橋	13.90	5.10	不明				50	Ⅰ	10	長寿命化済み	100	2068	2062													1,530																												53,168							54,698
44	313	東石田橋	石田上10号線	PC橋	14.15	4.70	昭和44年	1969			49	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2069																				1,410																															1,410
45	13	杉本8号橋	丸山杉本線	RC床版橋	2.90	17.20	昭和44年	1969			49	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2069																				5,160																															5,160
46	57	神通川橋	西大井学校線	鋼RC橋	15.20	4.60	昭和44年	1969			49	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2069							1,106													2,486																1,106														4,697
47	273	岩立橋	石生谷和田線	RC橋+PC橋	10.00	9.05	昭和45年、拡幅不明	1970			48	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2070																					2,715																															2,715
48	31	新村橋	新町4号線	鋼RC橋	34.10	4.80	昭和45年	1970			48	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2070								2,574													4,734																2,574														9,881
49	323	下氏家北橋	上下氏家線	PC橋	8.00	6.80	昭和45年	1970			48	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2070																					2,040																															2,040
50	275	三の和田橋	下野田13号線	PC橋	12.10	6.70	昭和45年	1970			48	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2070																					2,010																															2,010
51	310	諭手橋	小泉7号線	鋼RC橋	9.60	7.30	昭和45年	1970			48	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2070								1,052													3,242																1,052														5,346
52	418	杉本6号橋	杉本吉江線	RC床版橋	2.40	17.10	昭和46年	1971			47	Ⅱ	40	長寿命化済み	100	2071																						5,130																														5,130
53	192	桜町南橋	駅前線	RC床版橋	6.00	12.10	昭和46	1971			47	Ⅱ	35	長寿命化済み	100	2071																						3,630																														3,630
54	280	冬島橋	石田野田線	PC橋	9.80	6.80	昭和46年	1971			47	Ⅱ	30	長寿命化済み	100	2071																						2,040																															2,040

（1） 橋梁別 補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化　　※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　　※更新年(平準化)：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　　※欄内数値は、補修・更新の金額(単位：千円)　　凡例 ： 長寿命化 更新 塗替 伸縮装置交換 塗替+伸縮装置交換 部分補修　　※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年(西暦)	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年(平準化)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計(千円)
55	60	神通川2号橋	田村西大井線	鋼RC橋	19.10	4.60	昭和46年	1971	2016	2016	47	Ⅱ	25	長寿命化済み	100	2071														1,389														2,769																1,389									5,548
56	265	上野田橋	上氏家漆原線	PC橋	13.00	6.80	昭和46年	1971			47	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2071																							2,040																															2,040
57	80	東清水橋	東清水8号線	鋼RC橋	11.00	4.10	昭和46年	1971			47	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2071									725														1,955																725															3,405
58	340	野田橋	石生谷熊田線	PC橋	11.60	8.00	昭和46年	1971			47	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2071																							2,400																															2,400
59	283	冬島西橋	岩立冬島線	PC橋	9.20	5.20	昭和46年	1971			47	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2071																							1,560																															1,560
60	77	尾花中橋	尾花1号線	RC橋	10.70	7.10	昭和46年	1971			47	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2071																							2,130																															2,130
61	233	北野5号橋	三六10号線	RC床版橋	4.50	8.60	昭和47年	1972			46	Ⅱ	25	長寿命化済み	100	2072																								2,580																															2,580
62	11	大野西橋	片上落井線	Box-C	2.00	19.30	昭和47年	1972			46	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2072																																																						0
63	130	吉谷南橋	吉谷南線	PC橋	11.40	6.80	昭和47年	1972			46	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2072																								2,040																															2,040
64	30	河端橋	下新庄13号線	鋼RC橋	34.30	4.80	昭和47年	1972			46	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2072										2,589														4,749																2,589															9,926
65	127	五反田橋	磯部中戸ノ口2号線	PC橋	13.10	4.90	昭和47年	1972			46	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2072																								1,470																															1,470
66	399	南井南1号橋	南井南線	PC橋	8.20	7.10	昭和47年	1972			46	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2072																								2,130																															2,130
67	58	和田川東橋	石田和田橋線	PC橋	17.00	7.50	昭和48年	1973			45	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2073																									2,250																														2,250
68	129	大野水門橋	片上落井線	Box-C	4.15	22.20	昭和48年	1973			45	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2073																																																						0
69	59	和田橋	石田和田橋線	PC橋	37.70	7.50	昭和48年	1973		2016	45	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2073																												3,375																													3,375
70	119	沖田橋	別所川島線	RC床版橋	6.40	10.60	昭和48年	1973			45	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2073																								3,180																															3,180
71	29	郷勺橋	下新庄幹線	PC橋	37.70	4.30	昭和48年	1973			45	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2073																								1,935																															1,935
72	90	金谷南橋	金谷2号線	PC橋	8.40	4.40	昭和48年	1973			45	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2073																								1,320																															1,320
73	136	吉谷東橋	別所中央線	RC橋+PC橋	10.40	6.80	昭和48年	1973			45	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2073																								2,040																															2,040
74	153	橋立東橋	吉谷橋立線	PC橋	12.50	7.20	昭和48年	1973			45	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2073																								2,160																															2,160
75	139	片上橋	吉谷喉橋線	鋼RC橋	12.20	7.20	昭和48年	1973			45	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2073											1,320													3,480																	1,320													6,120
76	85	公園東橋	西袋寺中線	PC橋	7.30	4.60	昭和48年	1973			45	Ⅰ	15	長寿命化済み	100	2073																								1,380																															1,380
77	76	東清水北橋	北中沢線	鋼RC橋	13.80	8.20	昭和48年	1973			45	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2073											1,682													4,142																	1,682													7,505
78	102	西袋2号橋	西袋7号線	PC橋	9.50	7.90	昭和48年	1973			45	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2073																								2,370																															2,370
79	341	上河内下橋	上河内3号線	PC橋	13.50	7.70	昭和48年	1973			45	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2073																								2,310																															2,310
80	150	舟枝3号橋	舟枝乙坂線	PC橋	9.40	6.70	昭和49年	1974			44	Ⅱ	30	長寿命化済み	100	2074																									2,010																														2,010
81	72	戸口上橋	戸ノ口1号堤防線	鋼RC橋	17.90	1.20	昭和49年	1974			44	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2074												472													832																		472													1,776

（1） 橋梁別 補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化　　※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　　※更新年(平準化)：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　　※欄内数値は、補修・更新の金額(単位：千円)

凡例 ： 長寿命化　更新　塗替　伸縮装置交換　塗替+伸縮装置交換　部分補修　　※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年(西暦)	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年(平準化)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計(千円)
82	81	清水町橋	東清水4号線	鋼RC橋	10.90	4.60	昭和49年	1974			44	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2074												793														2,173														793																		3,759
83	78	尾花下橋	尾花3号線	RC床版橋	8.95	3.40	昭和49年	1974			44	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2074																										1,020																																1,020
84	6	黒津橋	染南線	PC橋	24.00	16.90	昭和50年	1975			43	Ⅱ	50	長寿命化済み	100	2075																											5,070																																5,070
85	118	片山東橋	片山4号線	鋼RC橋	11.05	3.00	昭和50年	1975			43	Ⅱ	10	長寿命化済み	100	2075													563														1,463																563																2,588
86	128	東陽中北橋	東陽中北線	PC橋	7.70	4.80	昭和50年	1975			43	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2075																											1,440																																1,440
87	398	尾花橋	沢寺中線	PC橋	6.30	6.80	昭和50年	1975			43	Ⅱ	5	長寿命化済み	100	2075																											2,040																																2,040
88	406	平井南橋	平井南線	RC床版橋	8.70	5.90	昭和50年	1975			43	Ⅰ	5	長寿命化済み	100	2075																											1,770																																1,770
89	414	水落6号橋	有定鳥羽線	RC床版橋	9.00	10.00	昭和52年	1977			41	Ⅱ	95	長寿命化済み	100	2077																													3,000																																3,000
90	413	水落5号橋	有定鳥羽線	RC床版橋	4.00	10.00	昭和52年	1977			41	Ⅱ	90	長寿命化済み	100	2077																													3,000																																3,000
91	415	水落7号橋	有定鳥羽線	PC橋	3.00	10.00	昭和52年	1977			41	Ⅱ	90	長寿命化済み	100	2077																													3,000																																3,000
92	10	落井西4号橋	片上落井線	Box-C	2.00	14.20	昭和52年	1977			41	Ⅱ	50	長寿命化済み	100	2077																																																												0
93	42	長表橋	白鬼女下新庄線	PC橋	18.67	8.20	昭和52年	1977			41	Ⅱ	35	長寿命化済み	100	2077																													2,460																																2,460
94	9	落井西3号橋	片上落井線	RC橋	4.40	17.50	昭和52年	1977			41	Ⅱ	20	長寿命化済み	100	2077																													5,250																																5,250
95	98	椿坂橋	河和田区画整理13号線	RC床版橋	7.75	6.00	昭和53年	1978			40	Ⅰ	10	長寿命化済み	100	2078																														1,800																																1,800
96	1	落井西橋	片上落井線	PC橋	30.60	9.75	昭和54年	1979			39	Ⅱ	45	長寿命化済み	100	2079			2,925																											2,925																																5,850
97	15	莇生田西橋	河和田莇生田2号線	鋼RC橋+PC橋	15.80	7.55	昭和54,平成19年拡幅年	1979			39	Ⅱ	15	長寿命化済み	100	2079			4,050														1,785											4,050																				1,785														11,670
98	95	中山橋	河和田区画整理8号線	PC橋	9.20	10.40	昭和54年	1979			39	Ⅰ	10	41	85	2064	2055		19,002																																			71,760																				90,762
99	96	谷橋	片山西袋線	RC床版橋	7.80	6.10	昭和54年	1979			39	Ⅰ	10	41	85	2064	2055		12,527																																			35,685																				48,212
100	97	椿坂東橋	西袋1号線	RC床版橋	7.70	9.00	昭和54年	1979			39	Ⅰ	10	41	85	2064	2053		15,511																																					51,975																			67,486
101	5	鳥羽小橋	神明11号線	PC橋	24.20	6.40	昭和55年	1980			38	Ⅰ	25	40	100	2080			22,687																																																									22,687
102	394	川去橋	川去北線	鋼RC橋	13.60	9.20	昭和56年	1981			37	Ⅱ	15	40	100	2081				21,964															1,843																	1,843																				1,843				27,492
103	274	漆原橋	漆原上野田線	PC橋	13.70	25.60	昭和57年	1982			36	Ⅱ	15	39	100	2082				47,922																																																									47,922
104	46	黒津第3橋	神明27号線	PC橋	23.70	3.00	昭和57年	1982			36	Ⅱ	15	40	100	2082					13,887																																																									13,887
105	255	糺ニュータウン西橋	糺ニュータウン8号線	RC床版橋	10.50	4.40	昭和58年	1983			35	Ⅰ	25	39	100	2083					11,713																																																										11,713
106	61	石田1号橋	石田和田川排水機場線	PC橋	16.20	6.20	昭和58年	1983			35	Ⅰ	10	39	100	2083					17,718																		

（1） 橋梁別 補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化　　※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　　※更新年(平準化)：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　　※欄内数値は、補修・更新の金額(単位：千円)　　凡例 ： 長寿命化　更新　塗替　伸縮装置交換　塗替+伸縮装置交換　部分補修　　※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年(西暦)	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年(平準化)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計(千円)
109	390	黒津川歩道橋	黒津川歩道橋線	鋼橋	19.25	1.60	昭和59年	1984			34	Ⅱ	15	38	100	2084					7,900														1,192																1,192														1,192		11,476
110	17	莇生田橋	河和田莇生田2号線	鋼RC橋	20.40	8.20	昭和60年	1985			33	Ⅱ	30	38	100	2085						25,618														2,486																2,486														2,486	33,075
111	319	石田堤防橋	石田堤防線	PC橋	11.80	8.20	昭和60年	1985			33	Ⅱ	20	38	100	2085						18,190																																														18,190
112	54	神山東橋	若葉西和台線	PC橋	21.20	5.70	昭和60年	1985			33	Ⅱ	10	39	100	2085							19,363																																													19,363
113	393	赤橋歩道橋	上戸口中央線	RC床版橋	7.00	2.50	昭和60年	1985			33	Ⅱ	5	39	100	2085							8,565																																													8,565
114	8	東陽中橋	東陽中東線	PC橋	9.60	12.20	昭和60年	1985			33	Ⅰ	30	39	100	2085							21,658																																														21,658
115	359	青年の家橋	上氏家・漆原2号線	PC橋	11.10	7.70	昭和60年	1985			33	Ⅰ	5	39	100	2085							16,976																																														16,976
116	369	いの割橋	石田上21号線	PC橋	11.90	7.20	昭和62年	1987			31	Ⅱ	20	38	100	2087								16,792																																													16,792
117	316	石田神社橋	石田上22号線	PC橋	12.90	7.20	昭和62年	1987			31	Ⅱ	20	38	100	2087								17,437																																														17,437
118	48	黒津橋	下河端水落2号線	PC橋	21.50	8.20	昭和63年	1988			30	Ⅱ	15	37	100	2088								25,295																																														25,295
119	141	西郷勺橋	下新庄4号線	RC床版橋	8.80	6.00	昭和63年	1988			30	Ⅰ	20	38	100	2088									12,912																																													12,912
120	43	水落橋	鯖江駅北線	鋼橋	39.00	16.80	平成01年	1989			29	Ⅱ	25	37	100	2089									31,190														17,946																17,946															67,083
121	7	丹南橋	丹南広域道西線	PC橋	182.50	11.80	平成02年	1990			28	Ⅱ	30	37	100	2090										224,175																																													224,175
122	68	平成橋	鯖浦線	PC橋	181.30	5.80	平成02年	1990			28	Ⅱ	20	38	100	2090											120,115																																											120,115
123	70	叔羅橋	丹南自転車道線	鋼橋	88.80	3.80	平成02年	1990			28	Ⅱ	20	39	100	2090												25,867															10,617														10,617															47,101
124	408	平井自転車道橋	鯖浦自転車線	PC橋	8.30	5.80	平成02年	1990			28	Ⅰ	35	39	100	2090												12,851																																											12,851
125	25	落井橋	落井北線	PC橋	25.80	5.60	平成03年	1991			27	Ⅰ	10	39	100	2091													25,633																																										25,633
126	362	宮下橋	杉本石田上線	PC橋	13.00	7.20	平成4年	1992			26	Ⅱ	20	35	100	2092										17,501																																													17,501
127	32	枇杷橋	鯖江駅東線	PC橋	24.10	16.80	平成05年	1993			25	Ⅱ	40	38	100	2093														49,033																																											49,033
128	410	大門東橋	石田上東線	PC橋	15.25	8.20	平成5年	1993			25	Ⅱ	35	37	100	2093													20,717																																											20,717
129	370	西杉本橋	杉本28号線	RC床版橋	6.70	12.05	平成5年	1993			25	Ⅱ	20	36	100	2093												17,727																																													17,727
130	355	西番5号橋	処理場南線	RC床版橋	6.80	14.15	平成5年	1993			25	Ⅱ	20	37	100	2093													19,870																																													19,870
131	44	西山跨線橋(鉄道横断部)	市町村道西山長泉寺線	鋼橋	30.00	8.10	平成06年	1994			24	Ⅱ	55	38	100	2094														16,470															6,967															6,967															30,403
132	44	西山跨線橋(一般部)	市町村道西山長泉寺線	PC橋	49.98	8.10	平成06年	1994			24	Ⅰ	15	38	100	2094														50,377																																													50,377
133	367	二ノ和田1号橋	相生和田線	PC橋	12.10	6.70	平成06年	1994			24	Ⅰ	5	35	100	2094												16,176																																														16,176
134	389	踏雲橋	西山長泉寺線	PC橋	10.25	5.60	平成07年	1995			23	Ⅰ	50	38	100	2095															13,604																																													13,604
135	389	踏雲橋(一般部)	市町村道 西山長泉寺線	PC橋	43.12	2.70	平成07年	1995			23	Ⅰ	25	38	100	2095															25,149																																														25,149

（1） 橋梁別　補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　※欄内数値は、補修・更新の金額（単位：千円）

※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　凡例　：　長寿命化　更新　塗替　伸縮装置交換　塗替+伸縮装置交換　部分補修

※更新年（平準化）：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの

※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年（西暦）	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年（平準化）	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計（千円）
136	120	東陽中南橋(既存部)	東陽中東線	PC橋	10.85	11.30	平成07年	1995			23	Ⅰ	5	36	100	2095														21,770																																									21,770
137	4	小黒町16号線1号橋	小黒町16号線	PC橋	34.00	12.80	平成08年	1996			22	Ⅱ	55	38	100	2096																55,802																																							55,802
138	16	ラポーゼ西橋	上河内4号線	PC橋	15.10	6.20	平成09年	1997			21	Ⅰ	10	38	100	2097																	17,104																																							17,104
139	126	中戸口橋	磯部中戸ノ口線	PC橋	12.10	10.80	平成11年	1999			19	Ⅱ	15	36	100	2099																	22,280																																							22,280
140	37	黒橋	高速側道4号線	PC橋	50.30	4.20	平成12年	2000			18	Ⅰ	15	33	100	2100																30,948																																							30,948
141	417	神明橋	有定鳥羽線	鋼RC橋	71.50	14.80	平成13	2001			17	Ⅰ	30	35	100	2101				15,149														125,120																15,149														15,149				170,566
142	41	河端橋	橋立下河端線	PC橋	51.30	8.20	平成13年	2001			17	Ⅰ	25	36	100	2101																			51,845																																			51,845
143	51	天神橋	三尾野吉江線	鋼橋	83.76	11.25	平成14年	2002			16	Ⅲ	20	36	100	2102						26,363														42,583																26,363															26,363	121,674
144	50	弁天橋	吉江7号線	PC橋	73.00	6.70	平成14年	2002			16	Ⅱ	35	37	100	2102																					57,199																																	57,199
145	55	冬島西2号橋	西大井幹線	PC橋	15.90	8.20	平成14年	2002			16	Ⅰ	10	36	100	2102																				21,193																																			21,193
146	419	吉江橋	杉本吉江線	鋼RC橋	80.80	13.80	平成15年	2003			15	Ⅱ	70	37	100	2103							16,017														129,778																16,017																161,813
147	47	鳥羽橋	鳥羽中芦山線	PC橋	71.00	8.40	平成16年	2004			14	Ⅱ	20	37	100	2104																						72,410																																		72,410
148	49	米岡橋	北部循環線	PC橋	79.70	13.80	平成17年	2005			13	Ⅱ	20	37	100	2105																							115,285																																	115,285
149	69	落井西橋歩道橋	片上落井線	鋼RC橋	30.30	3.80	平成17年	2005			13	Ⅰ	30	38	100	2105										1,874														19,042																1,874															22,789
150	396	桃源清水2号橋	桃源清水線	RC床版橋	9.50	5.25	平成17年	2005			13	Ⅰ	20	38	100	2105																							12,363																																		12,363
151	397	桃源清水3号橋	桃源清水線	RC床版橋	6.30	5.30	平成17年	2005			13	Ⅰ	20	38	100	2105																							11,033																																		11,033
152	107	日之出橋	河和田中道線	Box-C	7.10	10.00	平成18年	2006			12	Ⅰ	10	37	100	2106																							6,951																																		6,951
153	73	中橋	落井6号線	PC橋	28.65	5.80	平成19年	2007			11	Ⅰ	10	36	100	2107																							23,484																																		23,484
154	108	大門橋	河和田4号橋	鋼RC橋	8.20	4.80	平成19年	2007			11	Ⅰ	10	37	100	2107											619													11,934																619															13,171
155	395	桃源清水1号橋	桃源清水線	RC床版橋	10.00	5.20	平成19年	2007			11	Ⅰ	5	37	100	2107																							8,424																																		8,424
156	27	水窪橋	舟枝乙坂線	PC橋	68.20	7.20	平成20年	2008			10	Ⅰ	25	36	100	2108																							57,617																																		57,617
157	2	川島大橋	鯖江河和田線	鋼RC橋	63.60	12.80	平成21年	2009	2018		9	Ⅱ	35	37	100	2109															11,740											94,714																				11,740										118,195
158	104	片山橋	片山2号線	RC橋	11.30	4.00	平成21年	2009			9	Ⅰ	10	39	100	2109																										11,865																														11,865
159	82	北中橋	東清水5号線	PC橋	11.20	5.20	平成21年	2009			9	Ⅰ	10	36	100	2109																									13,520																														13,520
160	21	大橋	小山線	PC橋	34.00	3.90	平成21年	2009			9	Ⅰ	10	36	100	2109																									23,629																														23,629
161	22	かり橋	川島北線	PC橋	32.20	6.20	平成21年	2009			9	Ⅰ	10	38	100	2109																										30,940																														30,940
162	24	磯部橋	磯部中戸ノ口線	PC橋	28.70	7.20	平成22年	2010			8	Ⅰ	20	35	100	2110																									27,628																														27,628

（1） 橋梁別　補修、更新時期、費用　　補修時期、更新時期を前倒し調整し、費用を平準化

（表示順：架設年、健全度、重要度の順）　※欄内数値は、補修・更新の金額(単位：千円)

※更新年：架設年に寿命年数を加えたもの　※更新年(平準化)：予算平準化のために、更新年を前倒し設定したもの

凡例　：　長寿命化　更新　塗替　伸縮装置交換　塗替+伸縮装置交換　部分補修

※塗替・伸縮装置交換の時期は、実績の補修交換時期が不明のものは長寿命化時期および更新の時期を基準に設定

No	管理番号	橋梁名	路線名	橋種	橋長	幅員	架設年	架設年(西暦)	塗替年度	伸縮装置交換年度	経過年数	健全度判定	重要度	長寿命化補修までの年数	寿命年数	更新年	更新年(平準化)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	金額合計(千円)
163	19	川島橋	別所川島線	PC橋	41.20	9.00	平成22年	2010			8	I	20	38	100	2110																														47,843																											47,843
164	26	松成橋	松成幹線	PC橋	69.60	7.20	平成22年	2010			8	I	15	39	100	2110			4,320																												63,032																											67,352
165	28	喉橋	吉谷喉橋線	PC橋	69.30	7.20	平成22年	2010			8	I	15	40	100	2110			3,240																													58,327																											61,567
166	75	黒金橋	上河内2号線	PC橋	10.10	8.80	平成22年	2010			8	I	5	37	100	2110																													17,733																											17,733
167	12	吉谷橋	別所吉谷線	RC橋	13.90	11.40	平成27年	2015			3	I	25	32	100	2115																													24,996																											24,996
168	105	八幡橋	片山3号線	RC橋	12.40	5.20	平成27年	2015			3	I	10	40	100	2115								1,560																													14,084																	15,644
169	123	二口橋	上戸ノ口三峰線	Box-C	8.40	7.20	平成27年	2015			3	I	5	40	100	2115																																					5,786																	5,786
金額合計(千円)																		1,921	89,341	90,411	69,250	95,254	76,451	84,025	51,397	252,256	130,633	82,462	66,782	73,056	133,771	82,699	61,128	47,762	130,388	56,803	69,831	67,254	144,519	120,661	142,486	106,792	100,116	126,976	103,439	102,611	63,665	71,928	81,037	173,021	153,308	186,399	156,704	204,764	191,179	149,248	150,760	181,701	167,252	288,852	186,209	200,775	171,450	180,278	215,702	196,292	230,928	6,361,928
